

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE
ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE
ARARAQUARA**

PRESTADOR: DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS – DAAE

Relatório R7 – Verificação de Não Conformidades

Americana, maio de 2018



Sumário

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR	3
1.1. MUNICÍPIO	3
1.2. PRESTADOR.....	3
2. EQUIPE TÉCNICA.....	3
2.1 ARES-PCJ.....	3
2.2 PRESTADOR.....	3
3. FISCALIZAÇÃO	4
4. NÃO CONFORMIDADES	4
ANEXOS.....	5

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1. MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Araraquara

Prefeito: Edinho Silva

Endereço: Rua São Bento, 840 – Centro

Telefone: (16) 3301-5101

E-mail: prefeitomunicipal@araraquara.sp.gov.br

Código ARES: 45

Lei Municipal que autoriza Convênio de Prestação de Serviços: nº 8.178/2014, de 09/04/2014

1.2. PRESTADOR

Nome: Departamento Autônomo de Água e Esgotos - DAAE

Responsável legal: Marcos R. Isidoro da Silva

Endereço: Rua Domingos Barbieri nº 100 Fonte Luminosa

Telefone: (16) 3324 9555

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Camilla Badini - Analista de Regulação e Fiscalização – Eng^a Civil

Thalita Salgado – Analista de Regulação e Fiscalização – Eng^a Ambiental

2.2 PRESTADOR

Francisco C. Neto – Coordenador de Tratamento de Água

Weverton Campos Nozella - Coordenador do Tratamento de Esgoto

Charles Mendonça – Gerente de Manutenção Eletromecânica

Renata Lombardi – Gerente de Água e Esgoto

Wellington J.R. dos Santos – Controlador

3. FISCALIZAÇÃO

Em 22/05/2018, foram realizadas inspeções de campo, para verificação da execução das não conformidades previamente apontadas, nos seguintes subsistemas de água e esgoto:

- Captação Superficial – Paiol;
- Captação Superficial – Represa Cruzes;
- Estação de Tratamento de Água - Fonte;
- Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Araraquara.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

4

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014, as seguintes Não Conformidades:

NÃO CONFORMIDADES DAAE ARARAQUARA			
Descrição do Sistema	Código	Descrição da não conformidade	Prazo
CAPTAÇÃO ÁGUAS DO PAIOL	3.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
ETA FONTE	5.2	Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo	Em até 180 dias
	5.13	Existência de vazamentos aparentes	Dentro do Prazo (até 30/07/18, conforme CAC)

O DAAE Araraquara possui ainda 1 não conformidade vencida:

NÃO CONFORMIDADES DAAE ARARAQUARA			
Descrição do Sistema	Código	Descrição da não conformidade	Status
Sede/Atendimento DAAE	9.1.7	Não disponibilizar manual ou regulamento de prestação dos serviços no atendimento ao usuário	Vencida

ANEXOS

Formulários de Fiscalização

NC CAPTAÇÃO SUPERFICIAL

Agência Reguladora ARES-PCJ



Município: Araraquara

Nome: REPRESA CRUZES

Coordenadas



Latitude : -21.757709
Longitude : -48.178099
Altitude : 670.0 m
Accuracy : 28.823 m

Imagem(1)



Descrição(1): Represa Cruzes

Imagem(2)



Descrição(2): Captação

Imagem(3)



Descrição(3): Casa de bombas

NÃO CONFORMIDADES

Não há não-conformidades.


Data da inspeção: 05/22/2018



Município: Araraquara

Nome: ÁGUAS DO PAIOL

Coordenadas

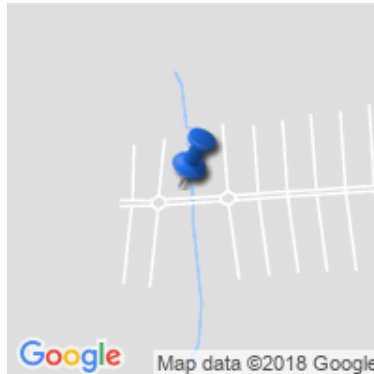

Latitude : -21.76209
Longitude : -48.209514
Altitude : 654.0 m
Accuracy : 53.094997 m

Imagem(1)



Descrição(1): Consertar a placa de aviso

NÃO CONFORMIDADES

Item 3.4: Ausência de extintor de incêndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Imediato

Informações complementares: Consertar a placa de aviso. Repor extintor de incêndio.

Data da inspeção: 05/22/2018



Município: Araraquara

Nome: ETA FONTE

Coordenadas



Latitude : -21.770406
Longitude : -48.169541
Altitude : 714.0 m
Accuracy : 74.333 m

Imagem(1)




Descrição(1): Vazamentos na estrutura da ETA. Contrato para manutenção já assinado.

Imagem(2)



Descrição(2): Entrada da ETA

Imagem(3)

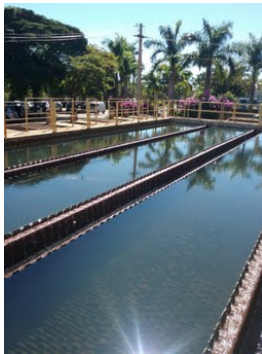

Descrição(3): Decantadores.

Imagem(4)



Descrição(4): Armazenamento coagulante Tanino.

Imagem(5)



Descrição(5): Lava olhos no laboratório.

Imagem(6)



Descrição(6): Resultados dos filtros.

Imagem(7)



Descrição(7): Bombas dos poços Iguatemi, Aldo Lupo, Selmi Dei, Zanin, Selmi Dei novo. Bombas reserva: poços Planalto, Flora, Paiol II, de Santi, São Rafael. Bombas em manutenção: poço Universal, Parque São Paulo, Santa marta, e Pinheirinho.

NÃO CONFORMIDADES

Item 5.2: Ausência de tratamento e/ou destinação adequada do lodo (Art. 57 do Decreto Estadual nº 8.468/1976). Prazo: Em até 180 dias

Item 5.13: Existência de vazamentos aparentes (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Imediato

Informações complementares: O conserto dos vazamentos da ETA já está previsto para esse primeiro semestre de 2018. Enviar à ARES-PCJ autorização da CETESB de disposição do lodo da ETA na rede de esgoto.


Data da inspeção: 05/22/2018



Município: Araraquara

Nome: ETA ARARAQUARA

Coordenadas

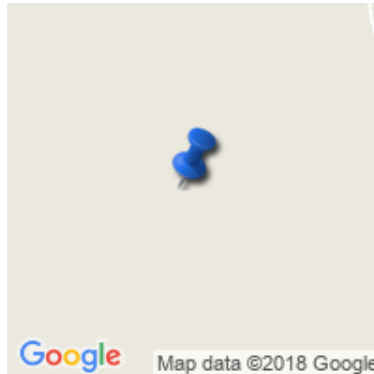

Latitude : -21.827962 Longitude : -48.246856 Altitude : 520.0 m Accuracy : 47.027 m
--

Imagem(1)



Descrição(1): Gradeamento

Imagem(2)



Descrição(2): Roscas dos desarenadores

Imagem(3)



Descrição(3): Roscas dos desarenadores

Imagem(4)




Descrição(4): Aeradores da lagoa 1

Imagem(5)



Descrição(5): Saída efluente

Imagem(6)

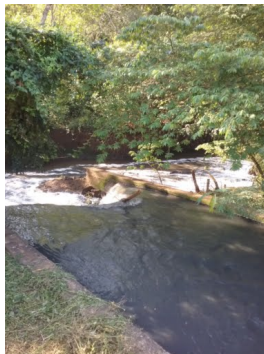

Descrição(6): Saída efluente

NÃO CONFORMIDADES

Informações complementares: Tratamento do lodo ainda não está operando. Foi informado pelos técnicos do DAAE que a operação começaria dia 23/05/18.

Data da inspeção: 05/22/2018
